

**29. Juli 2005
Cafeteria und Mehrzwecksaal
inklusive WC Anlagen**




**30. September 2005
Büro und Aufenthaltsräume**



**Übersicht der
Abgabetermine**

An der letzten Baukommissionsitzung des letzten Jahres wurden die definitiven Abgabetermine bestimmt. Sehr erfreulich ist, dass der Neubau (wenn man sieht, wie der ehemalige Bettentrakt saniert wird, kann man von einem Neubau sprechen) rund 3 Monate früher als geplant fertig sein wird. Verantwortlich für dieses Ergebnis sind: Die Bauleitung, welche die gesamten Termine gut aufeinander abstimmt; die beteiligten Firmen, die neben einer ausgezeichneten Arbeit auch immer zur richtigen Zeit auf der richtigen Baustelle waren. Ein wesentlicher

Grund der nicht unbedeutend ist, war das Wetter, welches uns keine zusätzlichen Schwierigkeiten und Aufwendungen bereite. Durch diese erfreuliche Tatsache werden wir vom 28. November 2005 bis 2. Dezember 2005 von den Provisorien in den Neubau zurückzögeln. Bereits jetzt haben wir die Zusage des Bevölkerungsschutzes, dass sie uns während dieser Zeit wieder unterstützen. Auf dieser Seite möchten wir Ihnen die verschiedenen Zügelangaben angeben, und wie der Stand auf der Baustelle Ende 2004 ist.

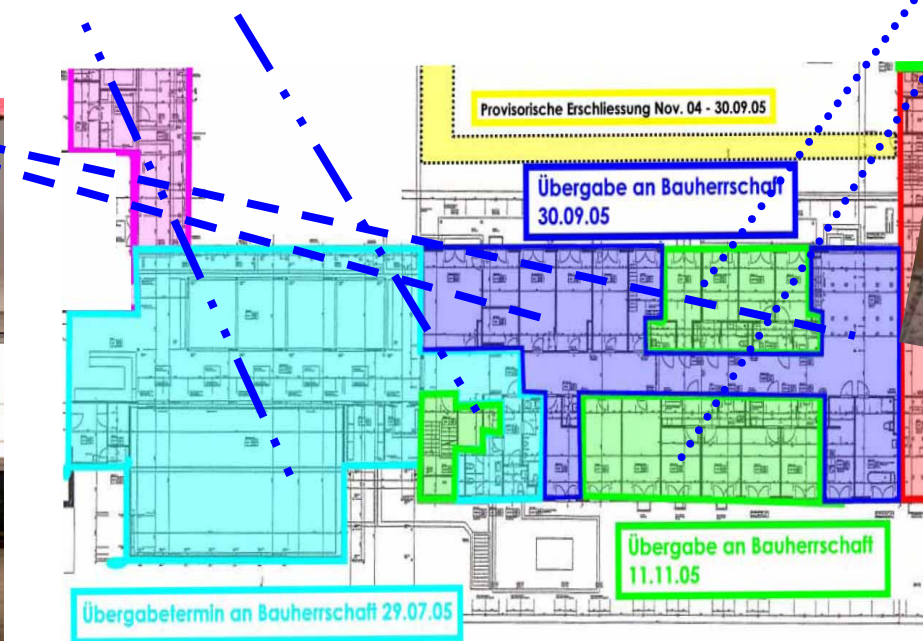

Anfangs Oktober 2005

Demontage des provisorischen Verbindungsgang. Erschliessung Speisesaal / Kapelle durch den Neubau

11. November 2005

Es ist kein Fasnachtscherz. Aber an diesem Termin wird die Bauleitung den gesamten Gebäudekomplex mit dem Bettentrakt sowie den Untergeschossräumen der Bauherrschaft übergeben. Die Uhrzeit ist noch nicht bestimmt. (11.11 Uhr ist nicht ausgeschlossen).



Frühjahr 2006

Zu diesem Zeitpunkt sollten die letzten Arbeiten an der Aussenanlage abgeschlossen sein.
